

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:** marzo de 2018

**Fecha de elaboración del Documento:** 02 de abril de 2018

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Planeación</b>
<b>Nombre de la institución:</b> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		<b>Nombre</b>	M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
<b>Entidad federativa:</b> YUCATÁN		<b>Cargo</b>	Director General de Planeación y Efectividad Institucional
<b>Clavelnst 911</b> 31MSU0098J		<b>Teléfono</b>	9999 300900 ext. 1308
		<b>Correo electrónico</b>	elsy.mezo@correo.uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					AVANCE						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	
		FAM	OTROS RECURSOS									Total Recursos para la obra
		Nombre	Monto									
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.	17,637,983.67			17,637,983.67	2,185.00	70.00	15,771,715.91	1,866,267.76	Se adjudicó la obra a la empresa Consorcio Peninsular S.A. de C.V. Actualmente se concluyeron los colados de los tres niveles del edificio. A la par se llevan a cabo trabajos de albañilería en fachadas y acabados en interior y exterior al igual que firmes de concreto en la planta baja; han iniciado trabajos de colocación de cancelería de aluminio y plafones de tablaroca. El remanente se devolvió al no poder comprometer el recurso.	Se modificó el proyecto original por indicaciones de las autoridades universitarias para evitar hacer gastos que no sean indispensables en función de costos de operación y mantenimiento del edificio. Esto llevo a redefinir la conexión con la etapa anterior del proyecto y a revisar el cálculo estructural.	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados, lámparas LED y tratamiento de aguas negras para riego.
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.	2,500,000.00			2,500,000.00	371.00	100.00	2,499,998.90	1.10	Obra concluida e inaugurada el 18 de septiembre pasado.	El importe corresponde al pago del finiquito del convenio modificatorio celebrado con U.M. Construcción S.A. de C.V. También se considera el anticipo y las estimaciones 1 y 2 del contrato por Acabados e Instalaciones y a los gastos de administración directa para la conclusión de los trabajos. El remanente se usó para adecuaciones solicitadas por el usuario y complementar obras en exterior.	Se implementaron en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados y lámparas LED. Se cuidó particularmente el aislamiento para disminuir el calentamiento al interior.
<b>SUB TOTAL</b>		<b>20,137,983.67</b>		<b>0.00</b>	<b>20,137,983.67</b>	<b>2,556.00</b>						

Dr. José de Jesús Williams  
Rector

M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma  
Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**


**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:**

**Fecha de elaboración del Documento:**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
<b>Nombre de la institución:</b> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
<b>Entidad federativa:</b> YUCATÁN		Secretario General	
<b>Clavelnst 911</b> 31MSU0098J		9999 300900 ext. 1326	9999 300900 ext. 1293 9999 242031 <a href="mailto:vurzaiz@correo.uady.mx">vurzaiz@correo.uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA										Cobertura de la obra																	
	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Obra de continuidad		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico															
					Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total												
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.										X		2005	2006	2002 2003 2004	6,952,610 8,060,697 11,000,000	2002 2003	Intereses UADY equipamiento FAM	3,505,612 470,268	arqueología, comunicación social, historia, literatura latinoamericana, turismo, contador público, administrador de tecnologías de la información, mercadotecnia y negocios internacionales, derecho, comercio internacional, economía, educación, enseñanza de idioma inglés y psicología. Maestría en administración, administración tributaria, finanzas, gestión de la	3,429	2,897	6,326	202	370	572	X	X
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.										X		2012	2016	2009 2014	4,095,000 15,000,000	2009 2016 2017	Intereses FAM ingresos servicios institucionales ingresos servicios institucionales	507,288.56 960,031.85 884,320.37	Lic. en Arquitectura, Lic. en Diseño del Hábitat, Lic. en Artes Visuales. Mtra. en Arquitectura, Mtra. en Diseño Urbano, Mtra. en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat	616	582	1,198	14	26	40	X	X
<b>SUB TOTAL</b>																												

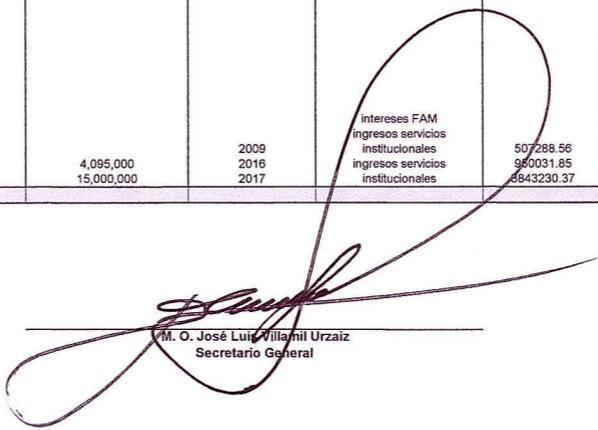

M. O. José Luis Villamil Urzaiz  
Secretario General

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:**

**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
<b>Nombre de la institución:</b>	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
<b>Entidad federativa:</b>	YUCATÁN
<b>Clavelnst 911</b>	
<b>31MSU0098J</b>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			SEDE DE LA OBRA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente
					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre			
					Programada	Programada	Programada							
1	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multifusos con capacidad hasta para 100 personas.</p>	X	X	<p>Impactar en mayor número de usuarios, a través de la infraestructura bibliotecaria del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, permitiendo que se integre el acervo bibliográfico de la Facultad de Contaduría para proporcionar un uso común de todas las dependencias del Campus, brindando mejores espacios acordes a las funciones propias del acceso a la lectura.</p>	diciembre 2017	31 mar 2018	junio 2018	310500001	Mérida	050	Mérida	97305	Ciencias sociales económico administrativas y humanidades	X
2	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.</p>	X	X	<p>Con las nuevas instalaciones de la biblioteca el Campus de Arquitectura, Arte y Diseño, se proporcionarán nuevos servicios, mismos que impactarán a los alumnos matriculados en sus tres licenciaturas (Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales). De estas tres licenciaturas, dos se encuentran acreditadas y arquitectura en particular, se encuentra en su tercer ciclo (AMPADEH). El total de alumnos registrados en la base de datos de la biblioteca, son 2,157, cantidad que cada año aumenta.</p>	01 junio 2017	09 sep 2017	18 sep 2017	310500001	Mérida	050	Mérida	97000	Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño	X
<b>SUB TOTAL</b>														

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:**

**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
<b>Nombre de la institución:</b>	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
<b>Entidad federativa:</b>	YUCATÁN
<b>Clavelnst 911</b>	
<b>31MSU0098J</b>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.	
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.		412 413 414 415 416 424	Facultad de Antropología Facultad de Contaduría Facultad de Derecho Facultad de Educación Facultad de Economía Facultad de Psicología				3	231					24	305	3	330					2	286	
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.		411	Facultad de Arquitectura										8	91			1	153			2	286	
<b>SUB TOTAL</b>					0.00	0.00		0.00	3.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	396	3	330	1.00	153.00	0.00	0.00	2	286







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:**

**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
<b>Nombre de la institución:</b>	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
<b>Entidad federativa:</b>	YUCATÁN
<b>ClaveInst 911</b>	
<b>31MSU0098J</b>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OTALES Monto del FAM para ampliación (pesos)
1	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.</p>	
2	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.</p>	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>
